

Møte i prosjekstyremøte
Ny løsning for digital smittesporing
02.12.2020

Agenda


Prosjektstyremøte

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt.
- Sak 2: Status og risikoområder
 - Overordnet / tidsplan
 - App og backend-utvikling
 - Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur (inkl. oppdatert status)
 - Personvern / DPIA
 - Informasjonssikkerhet / ROS
 - Test / kvalitet
 - Kommunikasjon (inkl. mediabudsjett)
 - Eksternt fagråd
 - Økonomi
- Sak 3: Eventuelt
- Sak 4: Neste prosjektstyremøte

Status

Smittestopp
Status for uke 48
02.12.2020

Smittestopp



Status for uke 48 - Overordnet

Smittestopp

- Møter i Joint Controller Subgroup & Technical Working Group, eHEALTH-NETWORK 25.11
- Møte med Microsoft 26.11: Konklusjon: Ønskede garantier kan ikke gis (for Norge)
- Møter & kontraktsforhandlinger for å etablere driftsplattform hos Netcompany
 - Intensjonskunngjøring publisert i dag: <https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-320870>, kontrakt klar til signering
- Møte med Datatilsynet 30.11, statusmøte med HOD 30.11.
- 4. Sprintdemo – løsningen er ferdig utviklet: Sprint 5 har fokus på utvidelse for å få nynorsk på startside + feilretting
- Etablering av ny infrastruktur (on-premises BÅDE hos NHN og Netcompany)
 - Status: Vi har kommet lengre med etablering av On-Prem nå enn vi var for en uke siden i skyen
- Konfigurasjonstesting gjennomført 30.11. og 1.12.
- Infrastruktur etablert for Integrasjonstesting og ytelsestesting
- DPIA nær ferdigstilt, ROS må revideres pga ny driftsstrategi
- Rapportasje på Dagsrevyen og <https://www.nrk.no/norge/slik-skal-fhi-unnga-ny-smittestopp-flopp-1.15268291> 1.12.
- Lansert informasjonssiden <http://helsenorge.no/smittestopp> med bl. a. spørsmål og svar

Start på Bokmål


Start på Nynorsk

Continue in English →

Status for uke 48: App og backend-utvikling

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Oppdatere brukergrensesnitt for meldinger, samt legge inn logo, ikon og ny font
 - Skrive test caser for sprint 4 og eksekvere tester for sprint 3, samt bistå med forberedelser til konfig-testing
 - Feilretting
 - Etablert Smittestopp i DEV og TEST-miljøer, påbegynt arbeid med å sette opp on-prem miljø
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Etablere Smittestopp i preproduksjonsmiljø i on-prem, samt bygg og deploy-pipelines på alle miljøer
 - Sidestille nynorsk og bokmål på startsidene, samt stor fokus på feilretting etter testing
 - Eksekvere tester for sprint 4 og støtte kundens testaktiviteter inkludert ende-til-ende testing, konfigurasjonstesting og ytelsestesting
- Usikkerheter (Risiko)
 - Forsinkelse av etablering av infrastruktur kan påvirke prosjektplanen og oppstart av ende-til-ende testing, ytelsestesting og akseptansetest
 - Forsinket oppstart av integrasjon og ende-til-ende testing gir prosjektet mindre tid til å utbedre eventuelle feil og påfølgende retesting og kan dertil påvirke prosjektplanen

Dashboard - DevOps

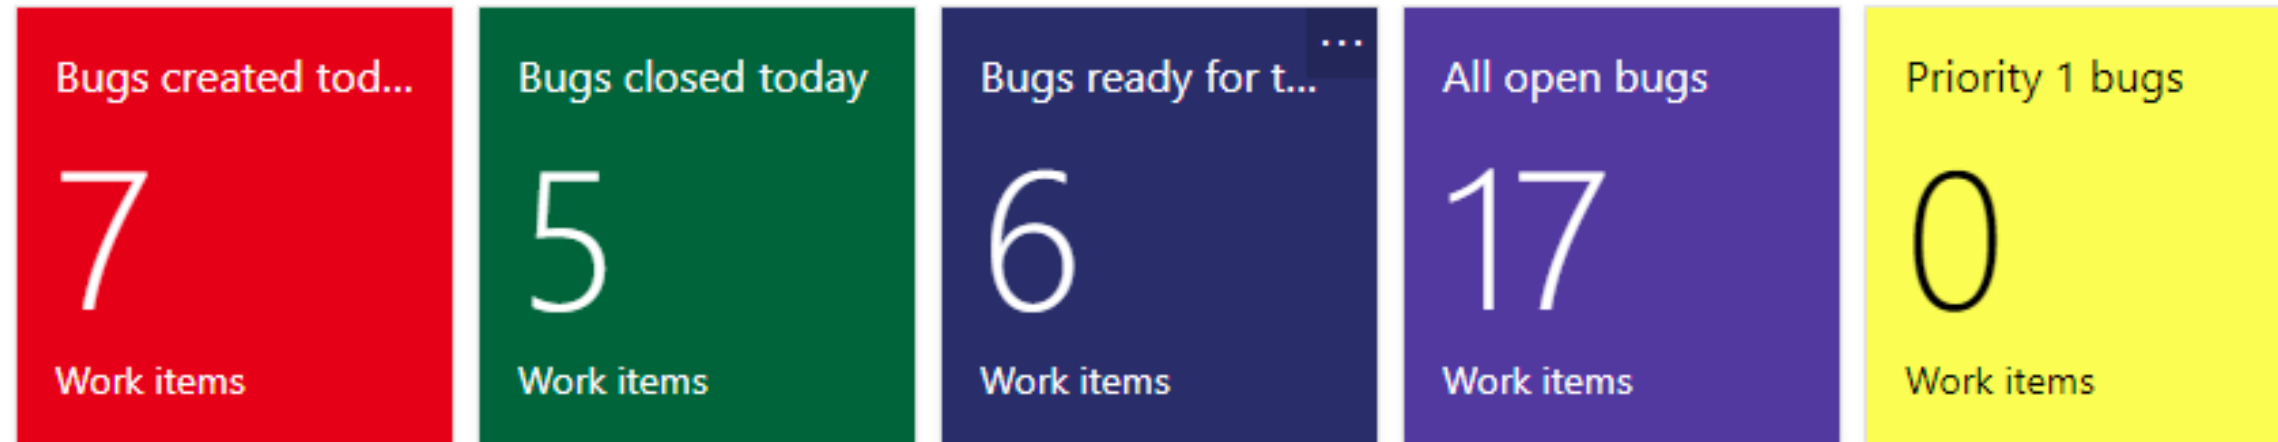

General status

(last updated: 1/12/2020)

- Sprint test - executing Sprint 4 tests (everyone)
- Samsung Galaxy S9 - no longer blocked (ID-porten)
- iOS time travel: New workaround reg. Pull key (future vs back in time)

Blocked tests


(last updated: 2/12/2020)

Sprint 4

- "[UI] Text in Bokmål/Nynorsk/English.." (Deadline (FHI): **Tuesday Dec 8th** - test after this date)

Sprint 3

- "[UI] Authentication... - BankID + D-number" (NB: Currently not possible to test, since BankID + D-number is rare in Norway)

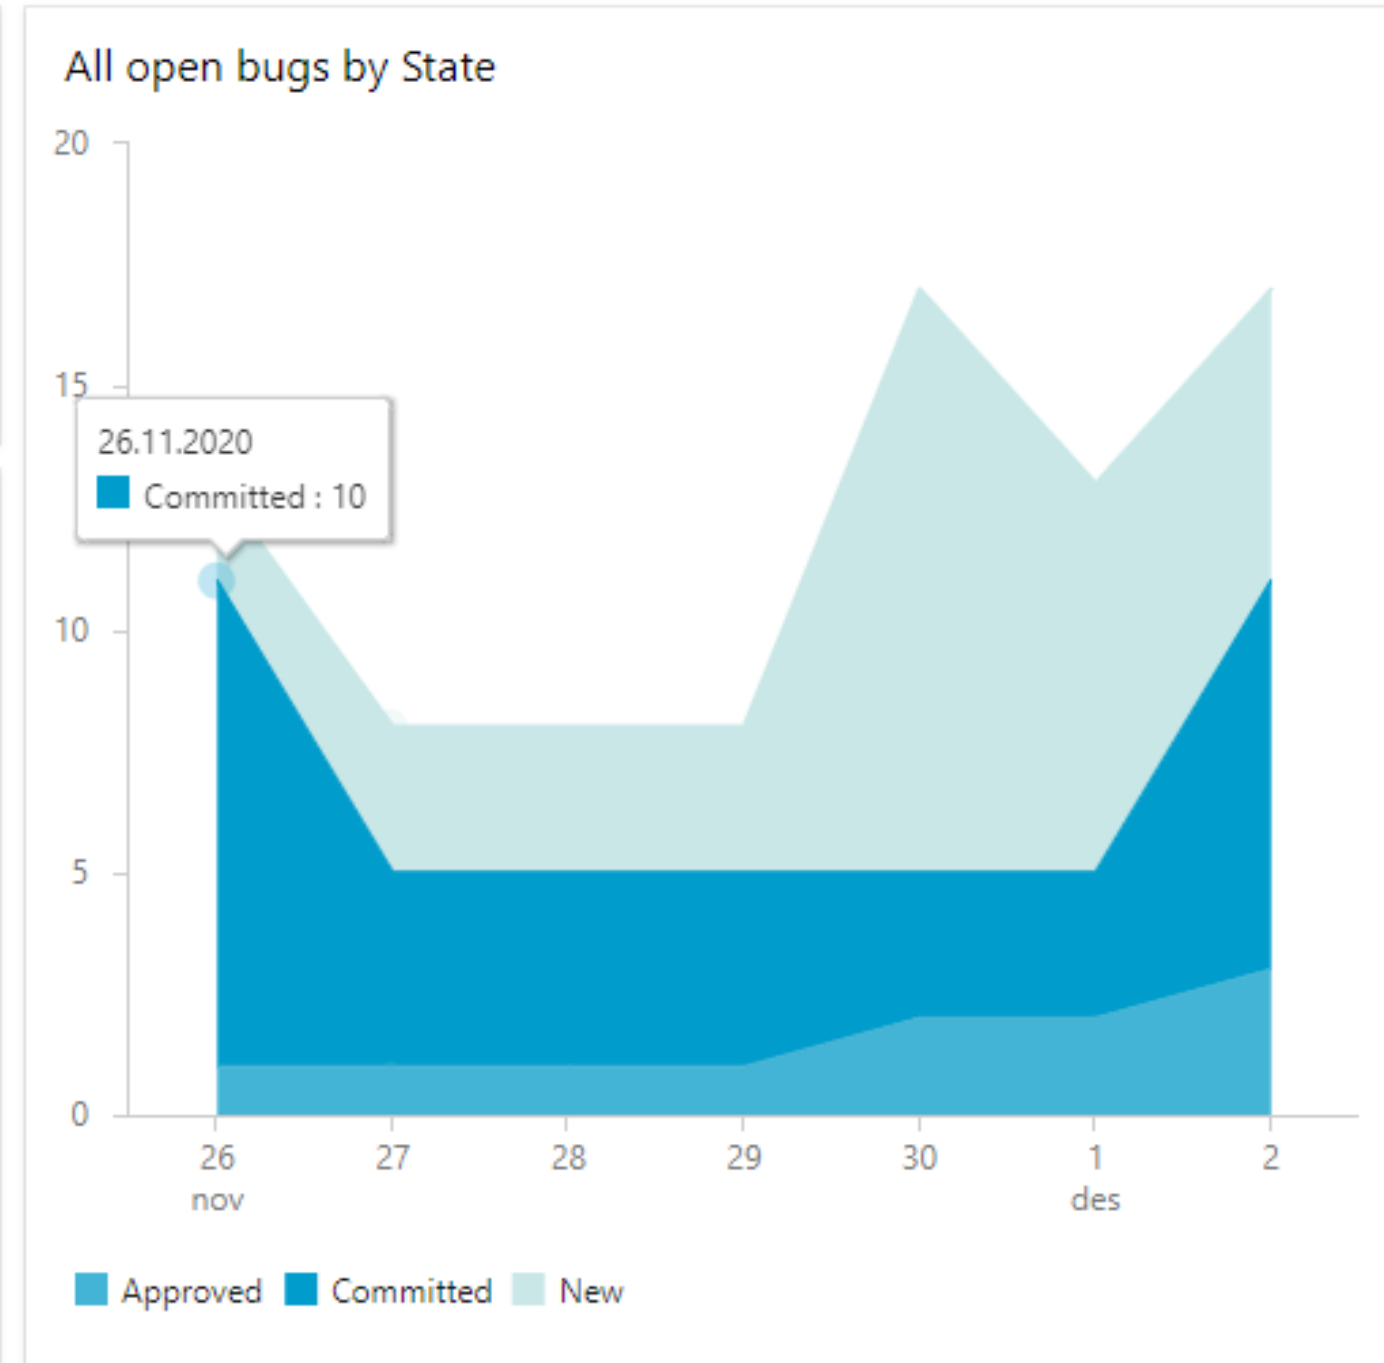


Sprint 4 - Testresults (messages etc)

	Passed	Not run	Failed	In progress	Total
Samsung Galaxy ...	13	5	3	1	22
Samsung Galaxy ...	15	4	3	0	22
iPhone SE	14	6	2	0	22
iPhone 6s	16	4	2	0	22
iPhone 11	17	2	3	0	22
Huawei P30	17	1	3	1	22
Total	92	22	16	2	132

Sprint 4 - Testresults (1device)

	Not run	Passed	In progress	Total
Samsung Galaxy ...	4	2	0	6
iPhone 11	4	1	1	6
Total	8	3	1	12

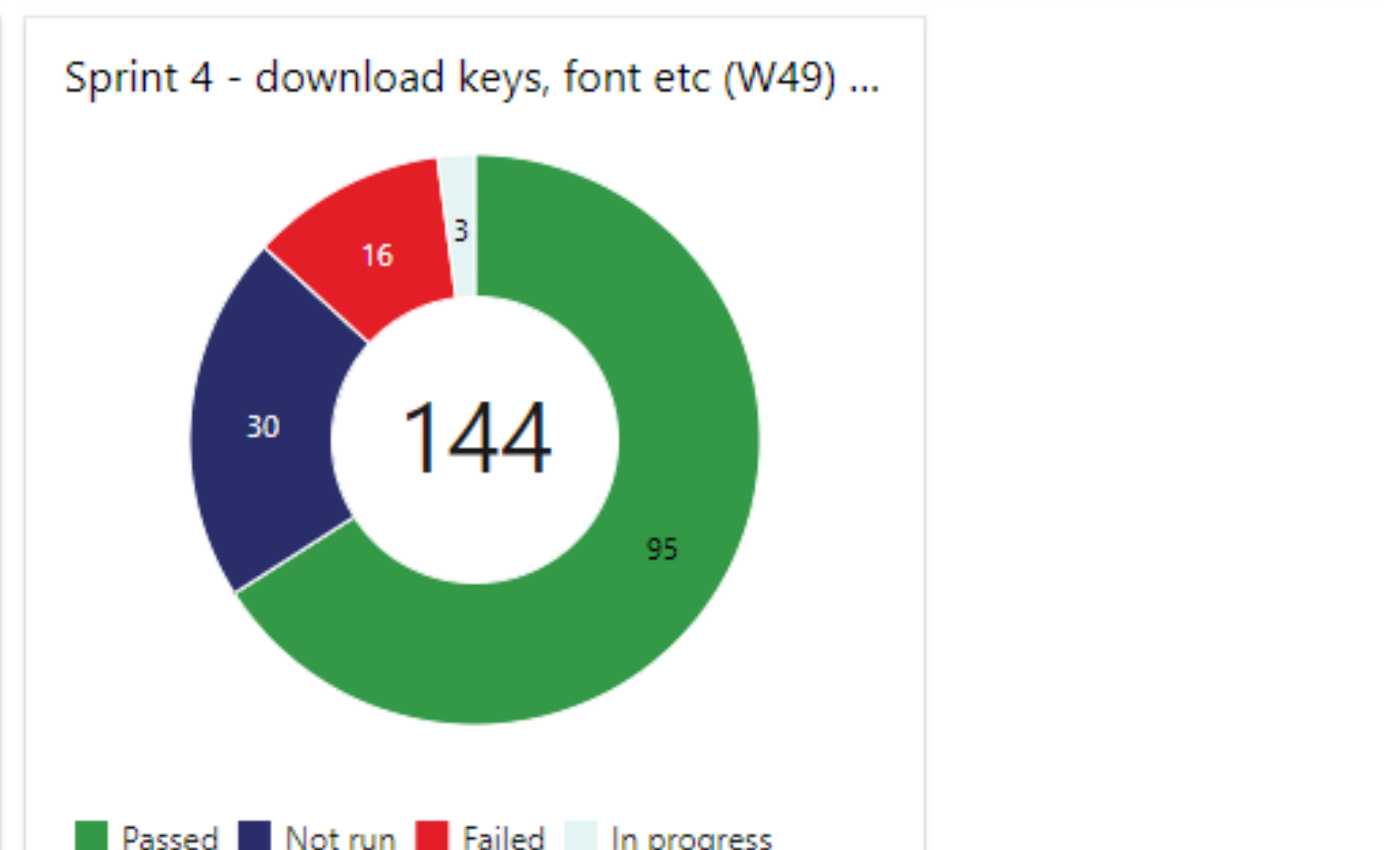

Status for uke 46 verifiseringsløsning/oppslag mot MSIS/infrastruktur

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)

- Utvikling MSIS-gateway for oppslag fra verifiseringsløsning
 - første versjon i test estimert 18/11
- Utvikling integrasjon mot MSIS-gateway fra verifiseringsløsning (VL)
 - første versjon i dev estimert 19/11

- Plan den neste uken (overordnet nivå)

- Åpne trafikk fra VL (dev test) til MSIS-gateway (test)
- Koble verifiseringsløsning til skript for data
 - Brukes for å begrense antall verifiseringer per person siste 24 timer (lagres pt "in memory")

- Usikkerheter (risiko)

- Bestillinger for brannmuråpning og ruting av trafikk for kobling mellom VL og MSIS-gateway

Status for uke 48: Informasjonssikkerhet/ROS

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Videre jobbing med risikoscenarier
 - Gjennomført ekstern workshops
 - Startet risikovurdering av ny driftsplattform
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Se på risikoreduserende tiltak
 - Gjennomføre ny ekstern workshop
 - Gjennomgå sikkerhetsmonitorering
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 48: Personvern/DPIA

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Jobbet med personvernerklæring, dialog med WR
 - Siste endringer DPIA
 - Møte med Datatilsynet
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Ferdigstille personvernerklæringen
 - Oversende endelig DPIA til Datatilsynet
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 48: Test og kvalitet

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Slutten av forrige uke gikk med til testforberedelser av Konfigurasjonstest.
 - Test av konfigurasjon i app ble gjennomført 30.11 og 01.12. Vi prioriterte å teste scenarier hvor manuell smittesporing er vanskelig; I en "butikk kø" og på en "buss". Det pågår nå analyser av testresultatene.
 - Funka er nå i gang med å gjennomføre test av Universell utforming i appen, de startet i går 01.12
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Gjennomføre ytelsestest ende til ende (oppstart i morgen 03.12 er planen) dette er forsinket iht opprinnelig plan
 - Få på plass integrasjon mot MSIS test i et preproduksjonsmiljø og få gjennomført integrasjonstest ende til ende (plan i dag 02.12) dette er forsinket iht opprinnelig plan
 - Gjennomføre sikkerhetstester, PEN test av BDO fom 07.12 (iht opprinnelig plan)
- Usikkerheter (Risiko)
 - Det ser ut som vi ikke får tilgang til sikkerhetstestrapporter fra Danmark, usikkert hvordan dette påvirker sikkerhetstest av den norske løsningen.
 - Analyser av dataene pågår fra Konfigurasjons testingen av appen. Hvis de ikke gir det resultatet vi forventer kan det medføre at vi må ende i konfigurasjonen og da må kjøre retest med de samme scenariene neste uke.

Status for uke 48: Kommunikasjon

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Justering av tekster i appen (Hege)
 - Publisering av hovednettside for appen på Helsenorge
 - Fokusgruppeundersøkelse gjennomført
 - Inngått avtale om medieplan for kampanje
 - Inngått avtale om personell for å svare ut sosiale medier fra og med 21. desember og to uker fremover
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Gjøre klar spørsmål og svar til nett, chatbot, koronatelefon på Helfo og sosiale medier
 - Slutføring av kampanjemateriell
 - Teams-møte med journalister om løsningen uke 50
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 48: Eksternt fagråd

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført møter i arkitekturråd og brukerforum
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Møte i fagråd / arkitektgruppen (tirsdager)
 - Møte i fagråd / brukerforum = demomøte (fredager)
- Usikkerheter (Risiko)

Status: Økonomi

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Tiltak er iverksatt for å sikre at så mye som mulig av årets kostnader havner på årets regnskap
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
- Usikkerheter (Risiko)

Vil bli oppdatert ifm månedsskifte
