

Prosjektstyremøte
ny løsning for digital smittesporing
04.11.2020

Agenda

Prosjektstyremøte

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til evt.
- Sak 2: Punkter for oppfølging fra forrige møte
- Sak 3: Status og risikoområder
 - Overordnet / tidsplan
 - Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur
 - Test / kvalitet
 - App og backend-utvikling
 - Personvern / DPIA
 - Informasjonssikkerhet / ROS
 - Kommunikasjon
 - Eksternt fagråd
 - Økonomi
- Sak 4: Gjennomgang av kommunikasjonsstrategi
- Sak 5: Eventuelt
- Sak 6: Neste prosjektstyremøte

Sak 2:


- Prosjektet bes om å tydeliggjøre fokus på App'en som et smitteverntiltak, for å synliggjøre at IT-utviklingen skjer i en smittevernsfaglig kontekst.
 - Tiltak: Knytte seg nærmere smittevernmiljøet ved å involvere de i konkrete, relevante leveranser
 - Konfigurering av parametere for å beregne risiko for smitte
 - Tekster
- Prosjektet bes om å innhente og kommunisere internasjonale erfaringer med tilsvarende app
 - Tiltak: Planlagt erfaringsutveksling med Danmark

Smittestopp
Status for uke 44
04.11.2020

Status for uke 44 - Overordnet


Smittestopp

- Mrk. Endret rapporteringsperiode som overlapper med forrige statusrapport. Framover vil prosjektets statusrapporter bli utarbeidet på mandager og publisert på tirsdager.
- Innleid leverandør er on-boardet. Prosjektintern Kick-off ble gjennomført 26.10. Møte i prosjektstyret gjennomført 28.10. Kick-off i fagrådet, 29.10.
- Gjennomgang av designskisser 30.10. Tekst oversendt til oversettelser (bokmål og nynorsk, engelsk versjon finnes). Designgjennomgang identifiserte behov for ny logo. Forrige logo for Smittestopp gir uheldige assosiasjoner til Geo-lokalisering.
- Planlagt deltakelse i FHI Gruppelderbrief fk fredag
- Utvikling har startet. 1. sprintdemo planlagt til fk fredag

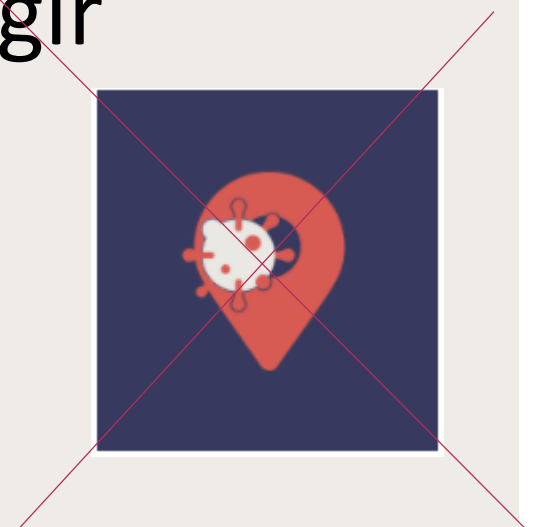

Overordnet tidsplan

Smittestopp

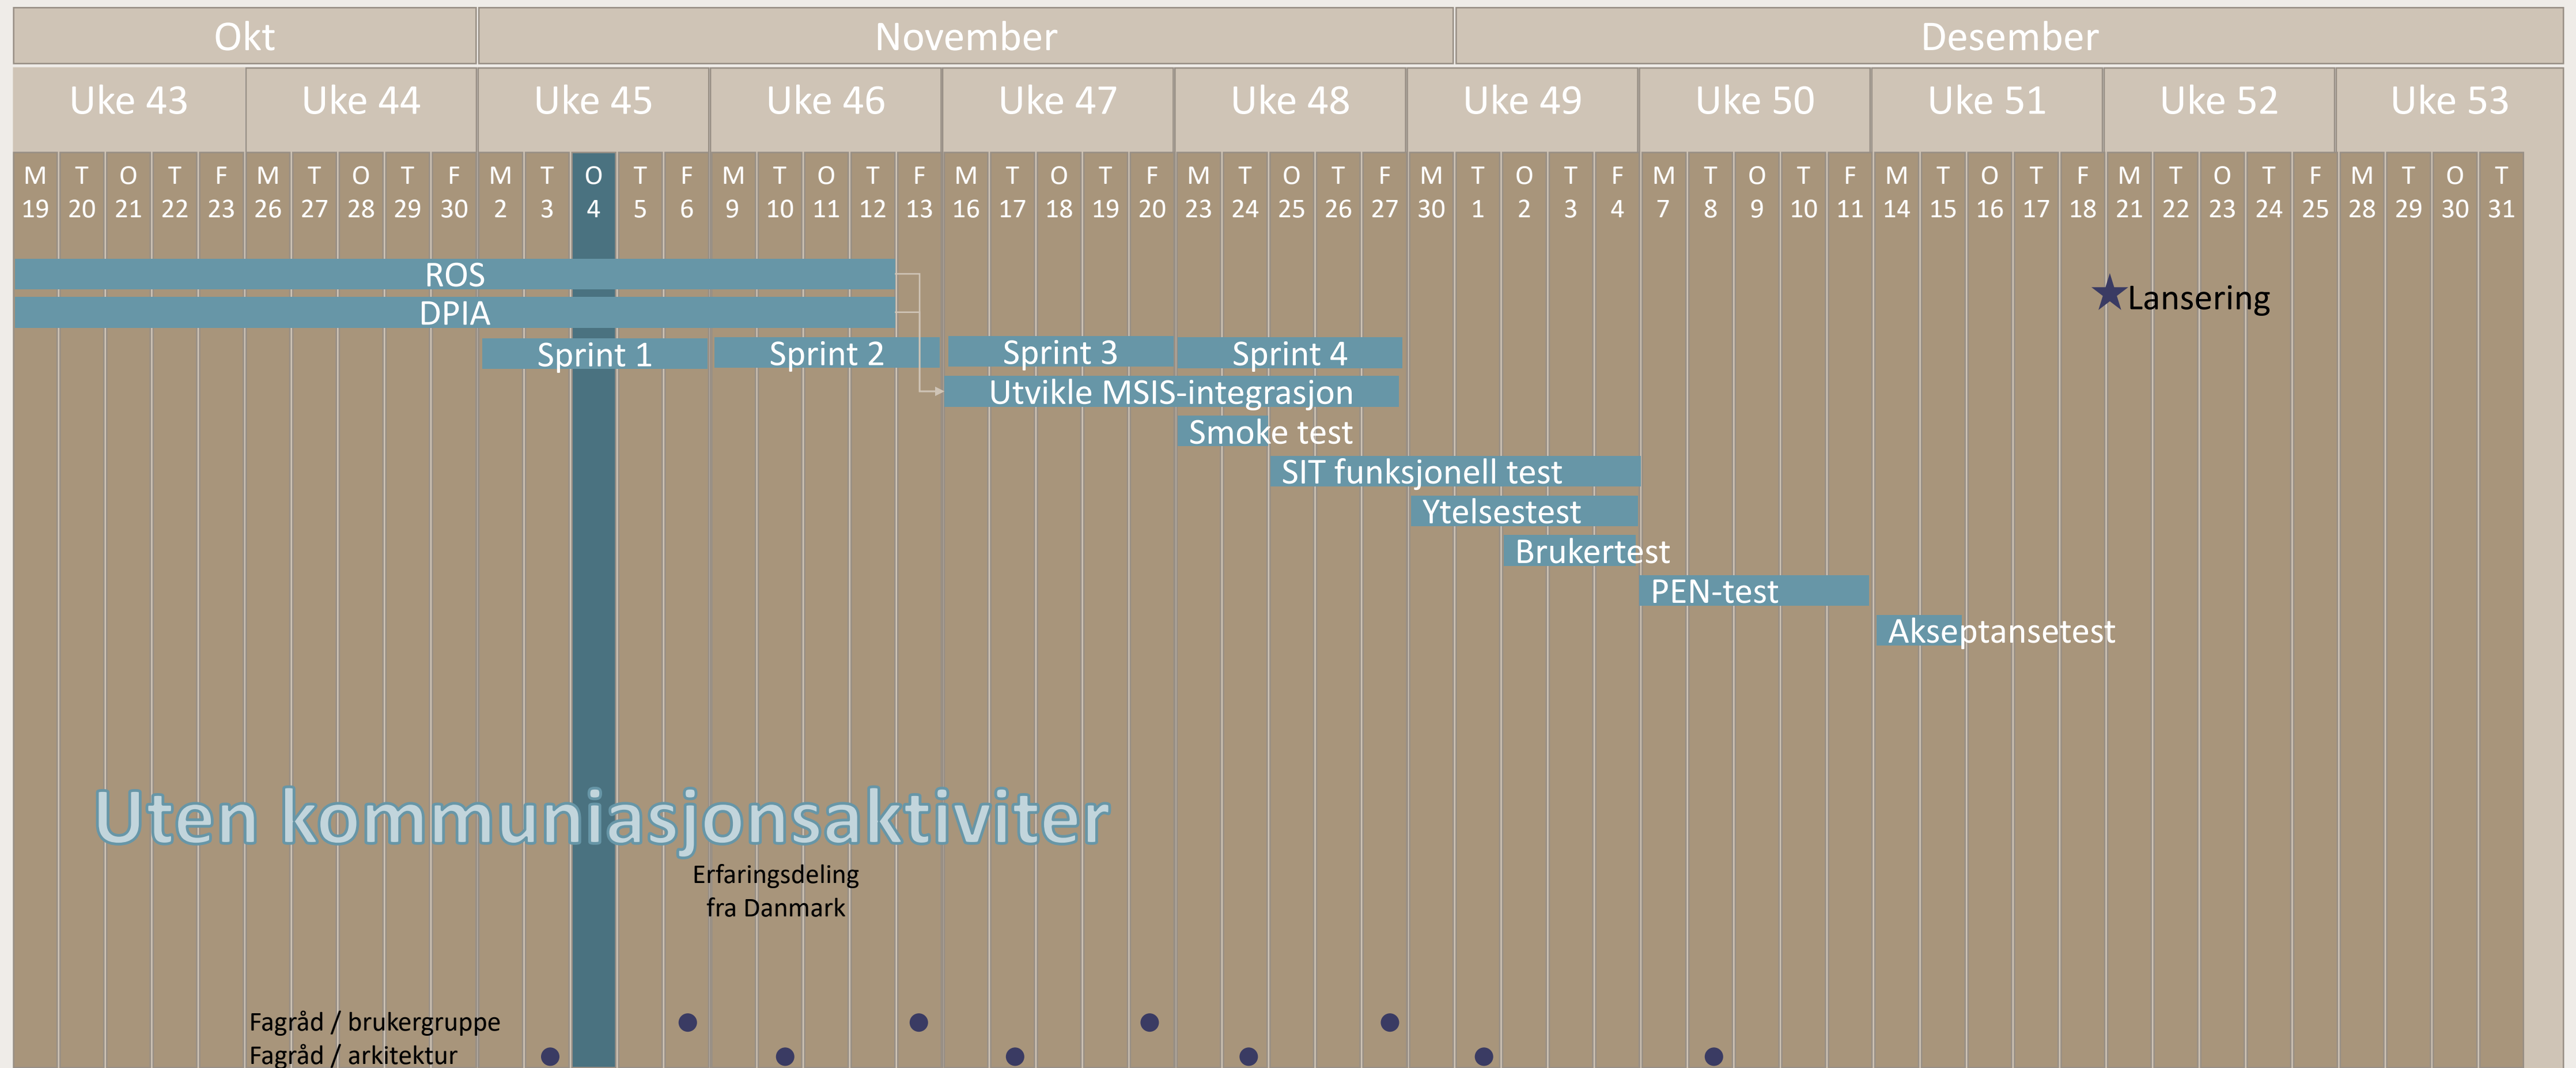

Status for uke 44 verifiseringsløsning/oppslag mot MSIS/infrastruktur

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Ga appene tilgang til verifiseringsløsning (DEV for alle miljøer)
 - Måtte tilpasse løsning til dansk spesifisering slik at app ikke trenger endringer her
 - Økt testdekning fra ca 36% til ca 72%
 - Ikke gjennomført: Deployment til Azure for Test og QA
 - Venter på infrastrukturavklaringer, DEV fungerer fint enn så lenge
 - Startet MSIS-gateway (komponent i sikker sone foran MSIS)
 - I første omgang kun Mock-implementasjon tilsvarende det verifiseringsløsning hadde
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Koble opp verifiseringsløsning til MSIS-gateway
 - Ferdigstille blokkeringsmekanisme (fra dansk spesifisering) i verifiseringsløsning
 - Spesifisering er implementert, men krever lagring til DB for å fungere skikkelig.
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 44: Test og kvalitet

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Testplan og forankring av test har vært hovedfokuset
 - Møter for spesifisering av ny funksjonalitet spesielt for norsk løsning
 - Div møter rundt test og kvalitet på ulike nivå
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Gjennomføre flere testmøter for å få landet teststrategi og plan
 - Ferdigstille versjon 1.0 av felles overordnet testplan og strategi med Danmark og leverandør
 - Lande hvilke fokustelefoner som skal benyttes for test
 - Gjennomføre første demo med brukertestgruppen fagrådet
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 44: App og backend-utvikling

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Gjennomført analysefase
 - Etablert produktkø for versjon 1
 - Design godkjent, og tekster sendt til oversetting
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Etablere Smittestopp i Azure
 - Oppdatere Smittestopp med FHIs designprofil, starter med Onboarding og samtykke-flyt
- Usikkerheter (Risiko)
 - PaaS vs. VM i Azure
 - For at understøtte go-live før jul og holde risikobildet på akseptabelt nivå forutsettes det at prosjektet settes opp med VM slik som danske smittestopp
 - Denne arkitekturen støtter fullt ut nødvendig skalering av backend

Status for uke 44: Informasjonssikkerhet/ROS

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - God framdrift i beskrivelser av risikoscenarier
 - Bestilt trusselvurdering fra Mnemonic
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomgå og vurdere risikoscenarier
 - Fortsette dialogen med NSM
 - Dialog med fagråd og eksterne sikkerhetsmennesker
- Usikkerheter (Risiko)
 - Kan appen defineres som «medisinsk utstyr»? I så fall, hvilke konsekvenser har det?

Status for uke 44: Personvern/DPIA

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført møte med Wikborg Rein om løsningen/samtykke (1. Utkast torsdag 5.11)
 - Hatt dialog med Netcompany.
 - Koordinere arbeidet ROS/DPIA
 - Avklare utestående punkter i DPIA med Netcompany, PVO
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Ferdigstille DPIA
 - Oversende utkast DPIA til Datatilsynet
- Usikkerheter (Risiko)
 - For at sikre, at Smittestopp-appen vedvarende er nødvendig og lever opp til dens formål, anbefaler PVO ved FHI at produksstyre skal foreta kvartalvise løpende evalueringer av appen og dens effekt, funksjonalitet og datakilder/datakvalitet på bakgrunn av utviklingen i smittespredningen i samfunnet, oppslutningen i befolkningen om appen og nasjonale strategier i Norge. Evalueringen bør også inneholde vurderingen av avsnitt 6 i DPIA om risikomomenter og tiltak sett i lys av risikobilde som foreligger på evalueringstidspunktet. Dette er i tråd med den danske løsningen. En slik evaluering bør fremgå av mandatet til styringsgruppen.

Status for uke 44: Kommunikasjon

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Evaluering av tilbud fra tre leverandører på kampanjetjenester
 - Valg av Dinamo som leverandør
 - Oversetting av teksten i den danske appen gjennom Semantix. Norsk oversettelse er klar i dag
 - Gjennomgang av danske nettsider
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Oppstartsmøte og konsept for kampanjeaktiviteter
 - Få nettsider og tekster på plass
- Usikkerheter (Risiko) - samme som tidligere
 - Ressurser - først og fremst nok folk til å ta publikumshenvendelser med mer
 - Tid for produksjon av kampanjemateriell frem mot start
 - At appen fungerer, og lett å skille fra både danske Smittestop og tidligere versjon av Smittestopp i navn, design mm

Status for uke 44: Eksternt fagråd

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Kick-off gjennomført
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Møte i fagråd / arkitektgruppen (tirsdager)
 - Møte i fagråd / brukerforum = demomøte (fredager)
- Usikkerheter (Risiko)
 - Ingen spesielle

Status: Økonomi

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Avklaring vedr. innsats fra Netcompany:
 - Reviderte estimater viser 4000 timer (+ usikkerhet).
 - Rutine for innsamling av endringsordre er etablert.
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Etablere prosesser for oppfølging av timer
 - Etablere prosesser for rapportering av påløpte og gjenstående kostnader
- Usikkerheter (Risiko)
