

Møte i prosjekstyremøte
Ny løsning for digital smittesporing
09.12.2020

Agenda

Prosjektstyremøte

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste, saker til evt.
- Sak 2: Oppfølging fra forrige møte
- Sak 3: Status og risikoområder
 - Overordnet / tidsplan
 - App og backend-utvikling
 - Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur (inkl. oppdatert status)
 - Personvern / DPIA
 - Informasjonssikkerhet / ROS
 - Test / kvalitet
 - Kommunikasjon (inkl. mediabudsjett)
 - Eksternt fagråd
 - Økonomi
- Sak 4: Eventuelt
- Sak 5: Neste prosjektstyremøte

Oppfølging av åpne saker

Åpne saker

Prosjektstyremøte

Statusrapportering

Etter produksjonsoppstart vil det bli behov for å rapportere aktivitet i app'en til interessenter, f. eks. presse.

- Tilgjengelig statistikk fra app'en:
 - Antall nedlastinger
 - Antall som har meldt seg smittet via app
 - Statistikk (og driftsmeldinger) planlagt publisert på fhi.no
- Andre planlagte tiltak:
 - Symptometer
 - Nytt alternativ (Smittestopp) på spørsmålet «hvorfør tester du deg» planlagt ved ordinær revisjon i midten av januar
 - Ønskes endring tidligere må dette prioriteres av FHI-ledelsen

Beredskapsplanlegging

Etter produksjonsoppstart vil det bli behov for felles beredskapsplaner.

- Prosjektet holder på å utarbeide dette.
- Inkluderer bemanning, beredskap og kommunikasjonsplaner for FHI, Netcompany, HELFO, Mindshare, NHN

Status

Smittestopp
Status for uke 49
9.12.2020


Status for uke 49 - Overordnet

Smittestopp

- DPIA ferdigstilt
- Personvernerklæring ferdigstilt (norsk og engelsk)
- Konfigurasjonstesting gjennomført på nytt med tilfredsstillende resultat.
- Pågående testing: PEN-test, ytelse- og volumtest pågår
- ROS-analyse planlagt ferdigstilt fredag 11.12.
- Produksjonsmiljø, on-prem, etablert hos Netcompany og NHN
- App-utvikling ferdigstilt
- App «godkjent» hos Google
- App til godkjenning hos Apple
- Nettsider hos fhi.no og helsenorger.no populert med innhold
- Pressekonferanse avhold. Kommunikasjon-, kampanje- og medieaktiviteter planlegges
- Brukerstøtte, inkl. forsterket beredskap under høytiden, under etablering
- Avtaler, inkl. databehandleravtaler under ferdigstillelse
- Plan for kontrollert og styrt nedlasting og driftssetting (navngitte brukere, kolleger, familie og venner) fra mandag 14.12. til lansering 21.12. under planlegging
- Planlagt «Go-Live» beslutning, dvs. beslutning om tilgjengeliggjøring av App på Apple Store og Google Play: Prosjektstyre 16.12

Overordnet tidsplan

Smittestopp

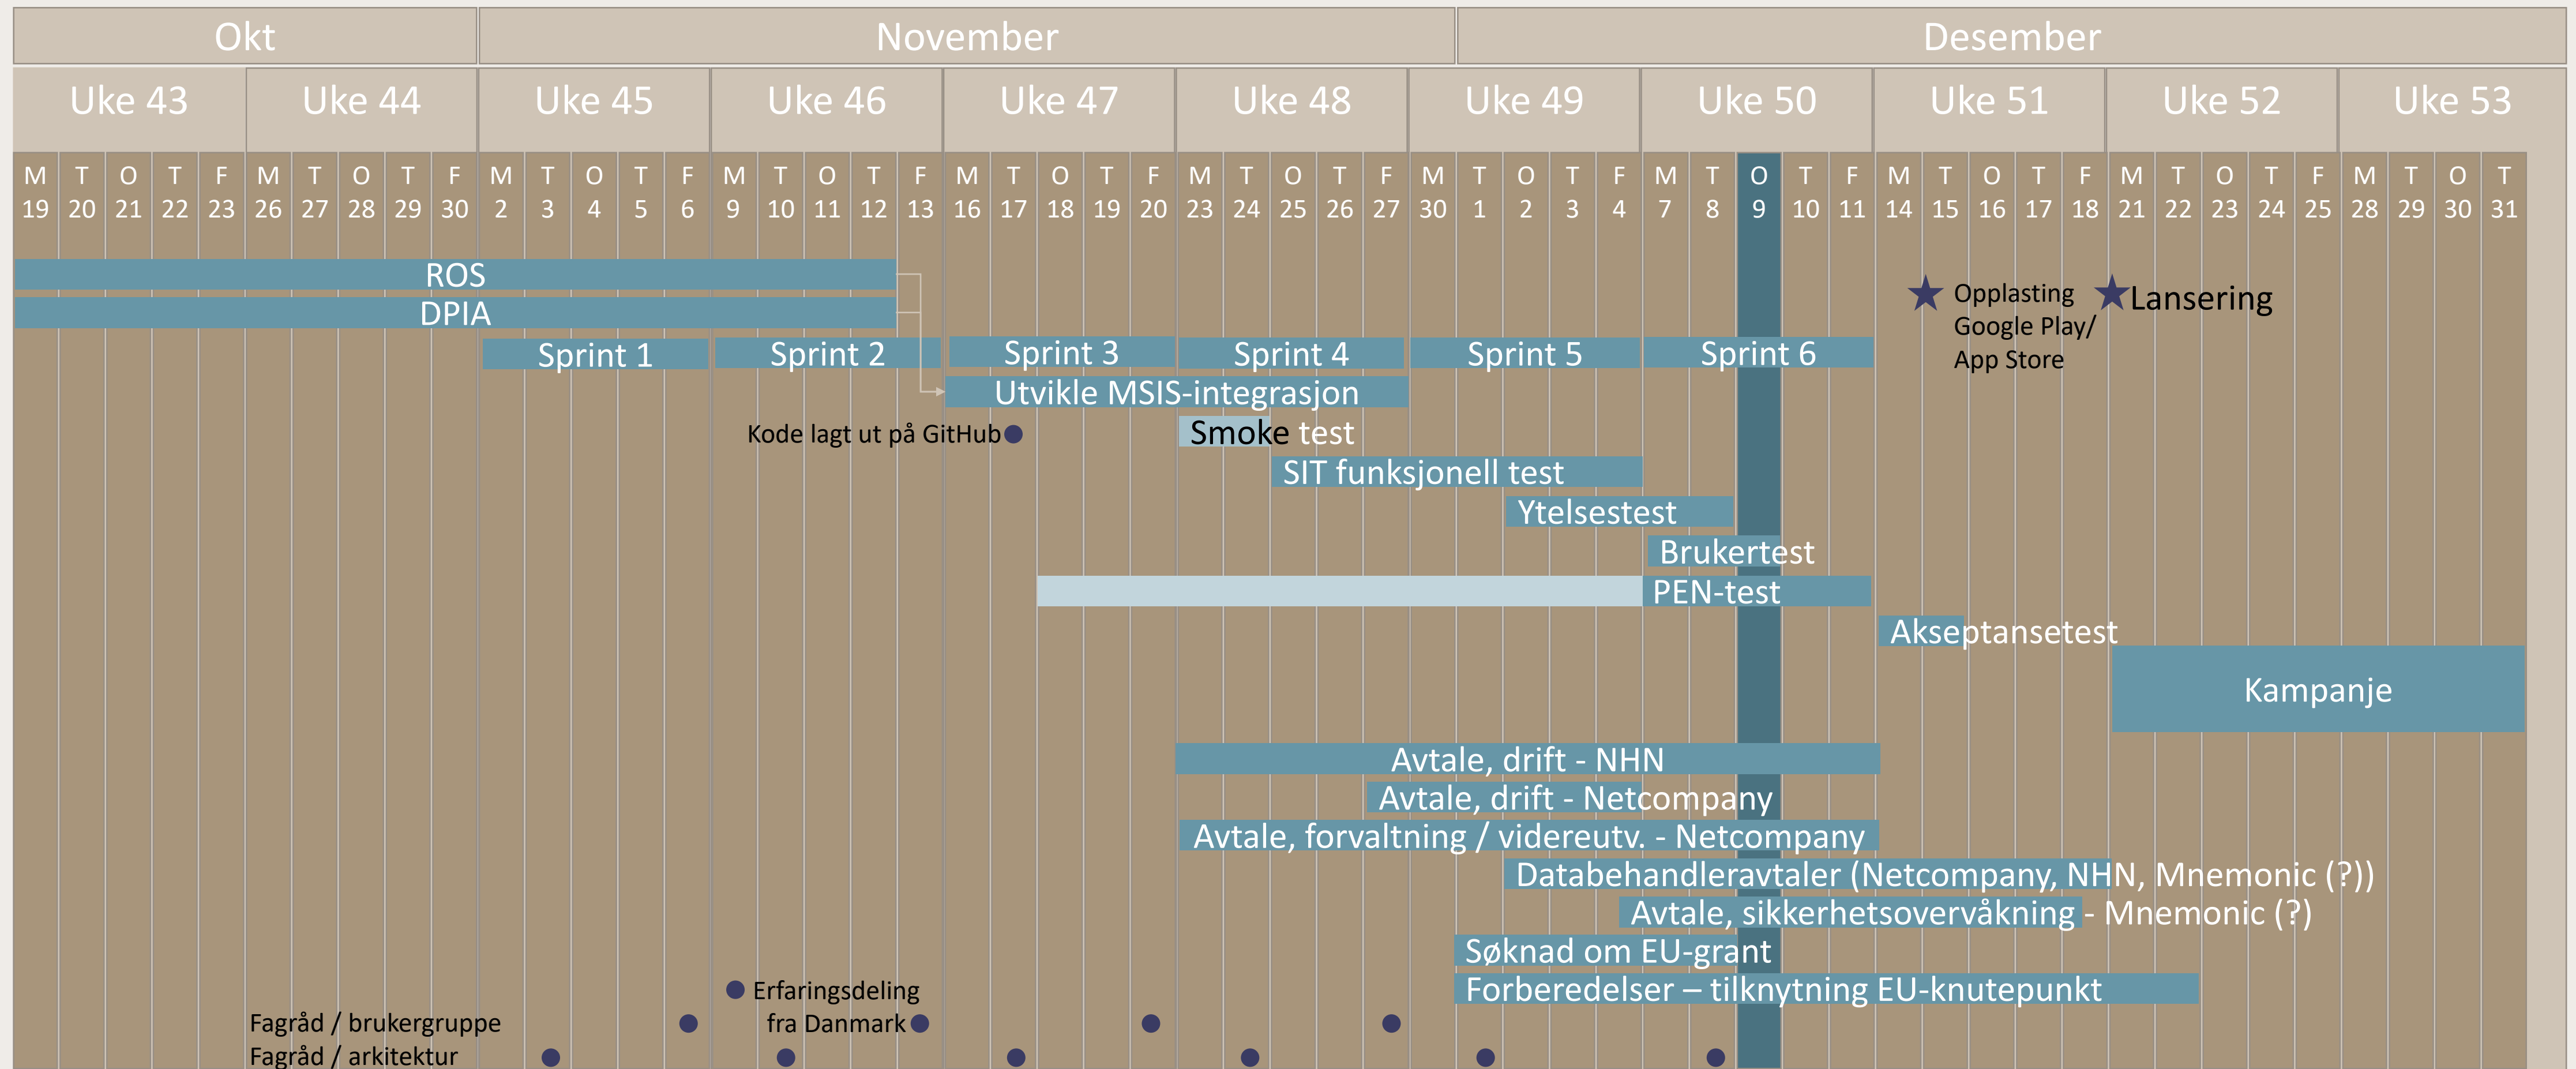

Status for uke 49: App og backend-utvikling

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Sidestilt nynorsk og bokmål på startsidene
 - Feilretting
 - Etablerte Smittestopp i preproduksjonsmiljø i on-prem
 - Startet etablering av produksjonsmiljø i on-prem
 - Eksekvert tester for sprint 4 og støtte kundens testaktiviteter inkludert ende-til-ende testing, konfigurasjonstesting
 - Bistått planlegging ytelsestesting og PEN-testing
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Sende Smittestopp-app til første review hos Apple og Google
 - Stabilisere app og fokus på feilretting av prioritet 1 og 2 feil
 - Etablere Smittestopp i produksjonsmiljø i on-prem, samt deploy pipelines på alle miljøer
 - Test sidestilling av språk, retesting av feilretting, ende-til-ende testing
 - Bistå ytelsestesting, PEN-testing, konfigurasjonstesting
- Usikkerheter (Risiko)
 - Gjenstår fortsatt testaktiviteter som kan avdekke feil det er knapt med tid å utbedre
 - Forsinket oppdatering i MSIS kan hindre brukere av Smittestopp til å melde seg smittet når de får prøvesvar

Status for uke 49 verifiseringsløsning/oppslag mot MSIS/infrastruktur

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Oppsett on-prem miljø hos NHN , pre-prod og prod
 - Testing, verifisering, kvalitetssikring av miljøer og integrasjoner
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Oppsett av «kald backup» hos OSL1 eller OSL3 for å dekke risikoscenario knyttet til brann i datahall i Trondheim
 - Slå på integrasjon til MSIS prod (oppkobling gjort, men ikke slått på)
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 49: Informasjonssikkerhet/ROS

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført ekstern workshop
 - Gjennomført risikovurdering av ny driftsplattform, både for GAEN-backend og verifiseringsløsning
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Se på risikoreduserende tiltak, spesielt for single-point-of-failure i løsningen
 - Gjennomføre ny ekstern workshop
 - Gjennomgå sikkerhetsmonitorering
 - Dele ferdig rapport med HOD, Datatilsynet
- Usikkerheter (Risiko)
 - Vurdere om rapport kan offentliggjøres

Status for uke 49: Personvern/DPIA

- Hva er gjort
 - Ferdigstilt og fått godkjent DPIA, oversendt HOD og Datatilsynet
 - Personvernerklæring er ferdigstilt og publisert på fhi.no på norsk og engelsk
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - -ingen-
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 49: Test og kvalitet

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Slutten av forrige uke gikk med til analyser fra konfigurasjonstesten resultatene viste at vi ikke fanget opp nok nærkontakter så de måtte justeres med etterfølgende retest den kommende uken.
 - Planlegging og klargjøring til PEN test og ytelsestest disse startet opp mandag 7. desember i preproduksjonsmiljøet
 - UU test ble gjennomført hele forrige uke og løper frem til 14.12
 - Verifiserte ende til ende mot MSIS i preproduksjon
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Ferdigstille konfigurasjonsretest med påfølgende analyser av testresultatene
 - Følge opp ev kritiske feil og retting og retest av disse, kun kritiske og svært alvorlige feil vil bli rettet nå fremover for å få en stabil løsning mot lansering
 - Følge opp testresultater fra PEN test og ytelsestest og vurdere om løsningen nærmer seg produksjonsklar
- Usikkerheter (Risiko)

Plan for produksjonssetting av Smittestopp

Tilgjengeliggjøre Smittestopp i Betaversjon i Testflight og Google Internal

- Planlegger for tidlig og kontrollert produksjonssetting i uke 51:
 - Tilgjengeliggjøring av Betaversjon av appen i Testflight og Google Internal
 - Forutsetter at resultater fra PEN test og ytelsestest er ok, altså ingen kritiske eller alvorlige sikkerhetsavvik eller ytelsesfeil
 - Produkteiere vil få tilgang til Betaversjon etter at app i Testflight har blitt verifisert ok av Testleder
 - Tidlig neste uke planlegger vi å rulle ut Betaversjon til flere brukere, flere deltagere i prosjektgruppen, prosjektstyre og ev andre via Testflight og Google Internal
 - Når app er tilstrekkelig testet i Testflight, dette blir Akseptansetesten, er det mulighet for å åpne opp for full produksjon
 - Planlagt beslutningspunkt: 16.12. på ettermiddagen

Status for uke 49: Kommunikasjon

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Organisering brukerstøtte: Helfo – Mindshare (sosiale medier i jula) – FHI – Dinamo
 - Slutføring spørsmål og svar-ark
 - Produksjon kampanje hos Dinamo
 - Oversatt tekster til ulike språk
 - Publisert personvernerklæring mm på fhi.no
 - Infomøte for journalister
 - Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Slutføring produksjon av kampanje
 - Opplegg og koordinering brukerstøtte
 - Planlegge lansering 21. desember (media, kampanje, brukerstøtte, tekster til nett mm)
 - Usikkerheter (Risiko)
 - Klarer vi å få nok oppmerksomhet og nok nedlastinger til at appen vil ha effekt?
- FHI - Viktig å understreke at appen er frivillig i all kommunikasjon

Status for uke 49: Eksternt fagråd

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført møter i arkitekturåd og brukerforum
 - Veldig positiv støtte fra fagrådet
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - ?
- Usikkerheter (Risiko)

Status: Økonomi

- Påløpt

- Regnskapsført: 400 000,-
- Godkjente fakturaer: 3,5 MNOK (+ noe ukjent i fakturamottaks og –godkjenningsflyt)

- Prognose

- Prognose 2020: 10,0 MNOK (hvorav 3,5 fra NHN er usikker ift. om kostnad blir ført i år)
- Prognose 2021: 6,0 MNOK
- - prognose inkluderer utvikling og etablering av driftsløsning
- - prognose inkluderer planlagte kommunikasjonstiltak

- Drift, forvaltning og videreutvikling i 2021 kommer i tillegg
