

Prosjektstyremøte
ny løsning for digital smittesporing
11.11.2020

Agenda

Prosjektstyremøte

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste, saker til evt.
- Sak 2: Saker til oppfølging fra forrige møte
- Sak 3: Status og risikoområder
 - Overordnet / tidsplan
 - App og backend-utvikling
 - Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur
 - Personvern / DPIA
 - Informasjonssikkerhet / ROS
 - Test / kvalitet
 - Kommunikasjon
 - Eksternt fagråd
 - Økonomi
- Sak 4: Eventuelt
- Sak 5: Neste prosjektstyremøte

Sak 2: Saker til oppfølging fra forrige møte

- Vedr. teknisk infrastruktur: diskusjonen i prosjektet knyttet til PaaS vs. VM i Azure
 - Status: Miljøer er under etablering, tilpasninger gjøres der det er mulig å få til på kort tid, forslag til plan for evt. i etterkant å komme mot mer optimalt driftsmiljø utarbeides.
- Vedr. spørsmål om app'en kan klassifiseres som «medisinsk utstyr»: Saken følges opp av CISO. Prosjektstyret ber om å bli holdt oppdatert.
 - Status: Det er gjort vurderinger – app'en tilfredsstiller ikke alle krav til medisinsk utstyr. Konklusjonen er at app'en IKKE er medisinsk utstyr. Sak lukkes for oppfølging i Prosjektstyre.
- Vedr. DPIA og behov for løpende vurdering av at det eksisterer et vedvarende behov for app'en og at den lever opp til dens formål: Prosjektet bes om å følge opp håndtering av dette.
 - Status: må håndteres som del av governance ved etablering av drift / forvaltning.
- Vedr. økonomi: Prosjektleder bes om å komme tilbake til programstyret med helhetlig økonomisk prognose og budsjett for hele prosjektet.
 - Status: er under utarbeidelse og vil bli forankret i FHI før det blir presentert til prosjektstyre

Status

Smittestopp
Status for uke 45
11.11.2020

Status for uke 45 - Overordnet

Smittestopp

- 1. Sprintdemo gjennomført i vårt tekniske miljø
- Strategier og planer, brukerhistorier og akseptansekriterier for test er laget
- DPIA overlevert for godkjenning
- ROS nærmer seg overlevering for godkjenning
- Samarbeid inngått med Dinamo vedr. kampanje
- Avholdt informasjonsutveksling med Danmark om Smitte | stop (<https://smittestop.dk/status>)
- Prosjektstyre er invitert til 2. sprintdemo

Status for uke 45: App og backend-utvikling

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Startet utvikling og sprint 1 gjennomført
 - Onboarding og samtykkeflyt over på FHIs designprofil
 - Etablert Smittestopp i Azure Sandbox-miljø med likt oppsett som danske Smittestopp
 - Jobbet videre med test planer og utarbeidet test caser
 - Bokmålstekster oversatt, gjennomført arbeidsmøter angående konfigurasjon av Smittestopp
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Sprint 2
 - Etablere Smittestopp i Azure test-miljø
 - Implementere flyt og brukergrensesnitt for å melde seg smittet i applikasjonen via Person-ID
 - Legge inn språk
 - Sette opp dashboard for testing, skrive test caser samt starte testing, blant annet konfigurasjonstesting
- Usikkerheter (Risiko)
 - Forsinkelse av integrasjon mot MSIS kan påvirke prosjektplanen og oppstart av ende-til-ende testing

Status for uke 45 verifiseringsløsning/oppslag mot MSIS/infrastruktur

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Bidratt med miljø for utvikling
 - Forberedt Infrastruktur-as-Code (IaC) for både verifiseringsløsning og backend-løsning
 - Dokumentert teknisk design vha analyser av det som er gjort i lavereliggende miljøer og avklaringsmøter med NC
 - Sørget for App Center-tilgang til NetCompany – for bygging/distribusjon av app
 - Justert modell for rollebasert tilgang
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Beslutte grad av separasjon mellom backend- og verifiseringsløsning
 - Videre bygging av test/qa/prod vha IaC
- Usikkerheter (Risiko)
 - Om vi må separere backend-løsning fra verifiseringsløsning i større grad enn antatt – kan potensielt påvirke noe av arbeidet som er gjort til nå
 - Arbeidsfordeling mellom NHN og NC på etablering av IaaS-miljø

Status for uke 45: Informasjonssikkerhet/ROS

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - God framdrift i beskrivelser av risikoscenarier
 - Mottatt trusselvurdering fra Mnemonic
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomgå og vurdere sannsynlighet og konsekvens for risikoscenarier (onsdag 11. nov.)
 - Godkjenningsmøte torsdag 12. nov.
 - Dialog med fagråd og eksterne sikkerhetsmennesker
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 45: Personvern/DPIA

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Hatt dialog med Netcompany
 - Koordinere arbeidet ROS/DPIA
 - Ferdigstilt DPIA
 - Oversendt DPIA for behandling hos Personvernombud og godkjenning
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Møte med Wikborg Rein om løsningen/samtykke (2. utkast)
 - Oversende utkast DPIA til Datatilsynet
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 45: Test og kvalitet

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Videre jobbing med testplanlegging og sikre kvalitet i alle ledd i utviklingsprosessen har vært hovedfokuset
 - Konfigurasjonstest av de norske GAEN parametrene for hva som er nærkontakt (kontakt) har startet
 - Kvalitetssikring av brukerhistorier til utvikling med produkteiere så vi får utviklet det vi skal ha
 - Avklart hvilke telefoner som skal brukes til test
 - Div møter rundt test og kvalitet på ulike nivå bla første demomøte med brukergruppen
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Gjennomføre risikoworkshop for testprosjektet
 - Lage testscenarier til FHI sin del av testen sammen med produkteiere
 - Jobbe videre med ferdigstilling av versjon 1.0 av felles overordnet Teststrategi og plan, er nå på versjon 0.7
 - Gjennomføre neste demo med brukertestgruppen fagrådet, fokus; diskutere Logo, Ikon og brukerundersøkelse om bruk av appen
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 45: Kommunikasjon

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Inngått samarbeid med Dinamo om kampanje og startet konseptplanlegging
 - Gjennomført brukerundersøkelse med 1000 respondenter. 1/3 sier de vil laste ned appen, 1/3 sier nei, og 1/3 vet ikke. Personvern er flagget av de som ikke tenker de vil laste ned appen.
 - Gått gjennom første utkast til app-logo, tas videre i fagrådet på fredag
 - Landet app-tekster
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Lage rammer for budskap og kanaler for kampanje
- Usikkerheter (Risiko) - samme som tidligere
 - Nok folk til å gjøre nødvendige ting. Prøver å løse det de nærmeste dagene.

Status for uke 45: Eksternt fagråd

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført møter i arkitekturåd og brukerforum
 - Slack-kanal for direkte kommunikasjon er etablert
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Møte i fagråd / arkitektgruppen (tirsdager)
 - Møte i fagråd / brukerforum = demomøte (fredager)
- Usikkerheter (Risiko)
 - Viktig at vi får behandlet og besvart / fulgt opp innspillene som kommer
- Kommentar:
 - Vi opplever stor positivitet i møtene med fagrådet og får gode tilbakemeldinger knyttet til vår åpenhet

Status: Økonomi

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Forberedt revidert kostnadsoverslag
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Forankre kostnadsoverslag
- Usikkerheter (Risiko)

Ekstramateriale



SMITTESTOPP



SMITTESTOPP

Nesten jevnt i holdning til å bruke appen.



Vi finner ikke mange signifikante utslag på undergruppene når det gjelder hvem som vil laste ned appen eller ikke.

Men vi ser at det er signifikant færre menn og personer i alderen 30-39 år.

Det er også mange som er usikre, 31%.

Norstat: n= 1000


Myndighetene har besluttet å utvikle en ny utgave av appen Smittestopp for å varsle nærkontakter om smitte. Basert på det du nå vet, kommer du til å ta i bruk en slik app?

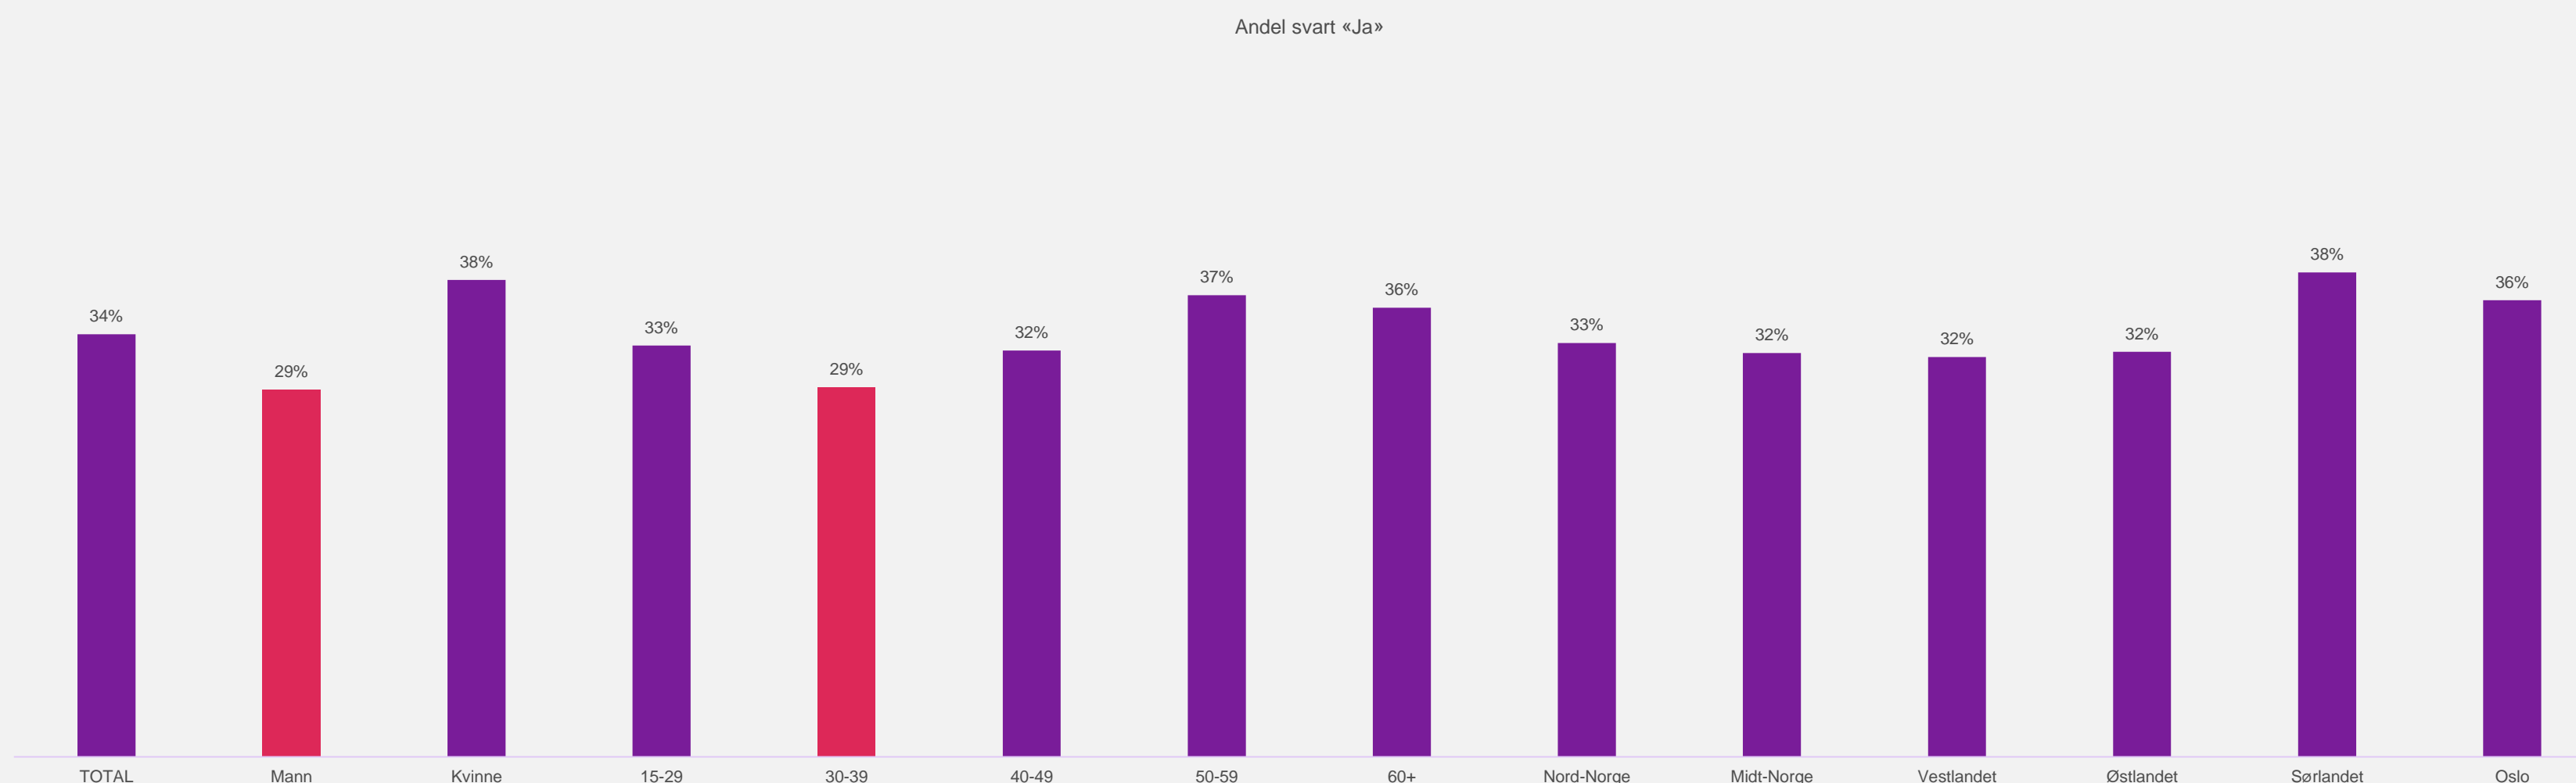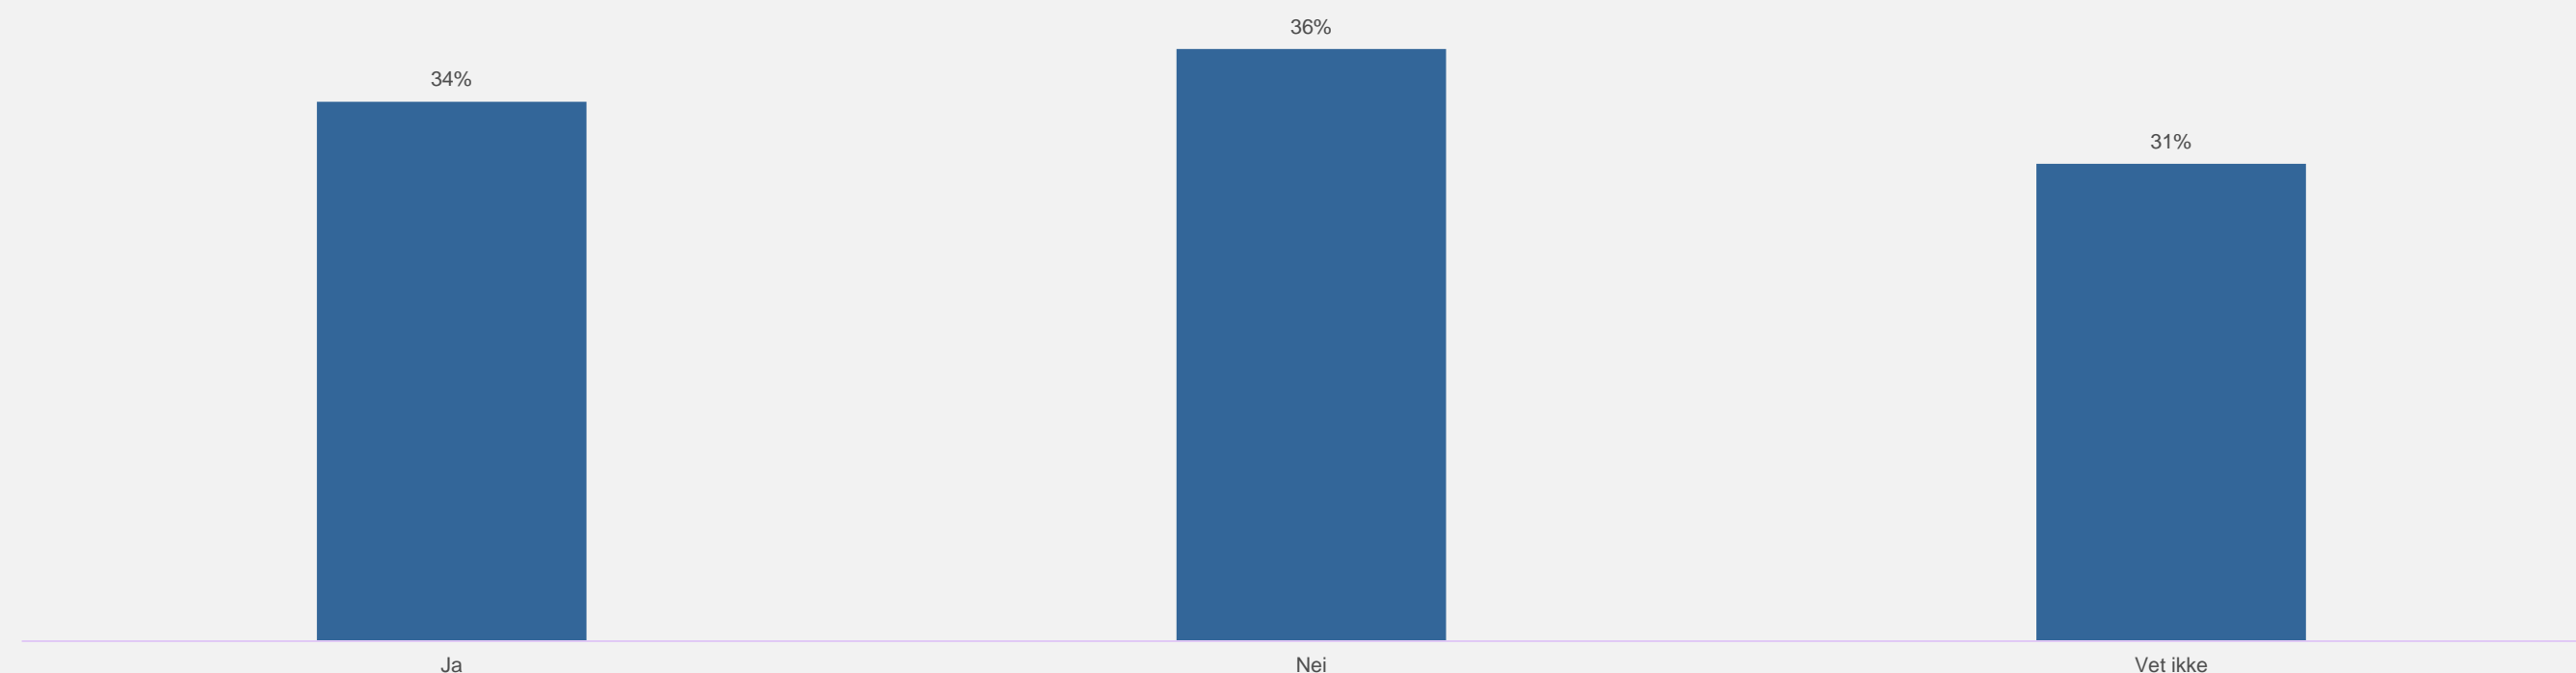

Samfunnsansvar er den største driveren.

Signifikant flere kvinner som oppgir at de ønsker å stoppe spredningen i samfunnet, 96%.

Norstat: n= 335

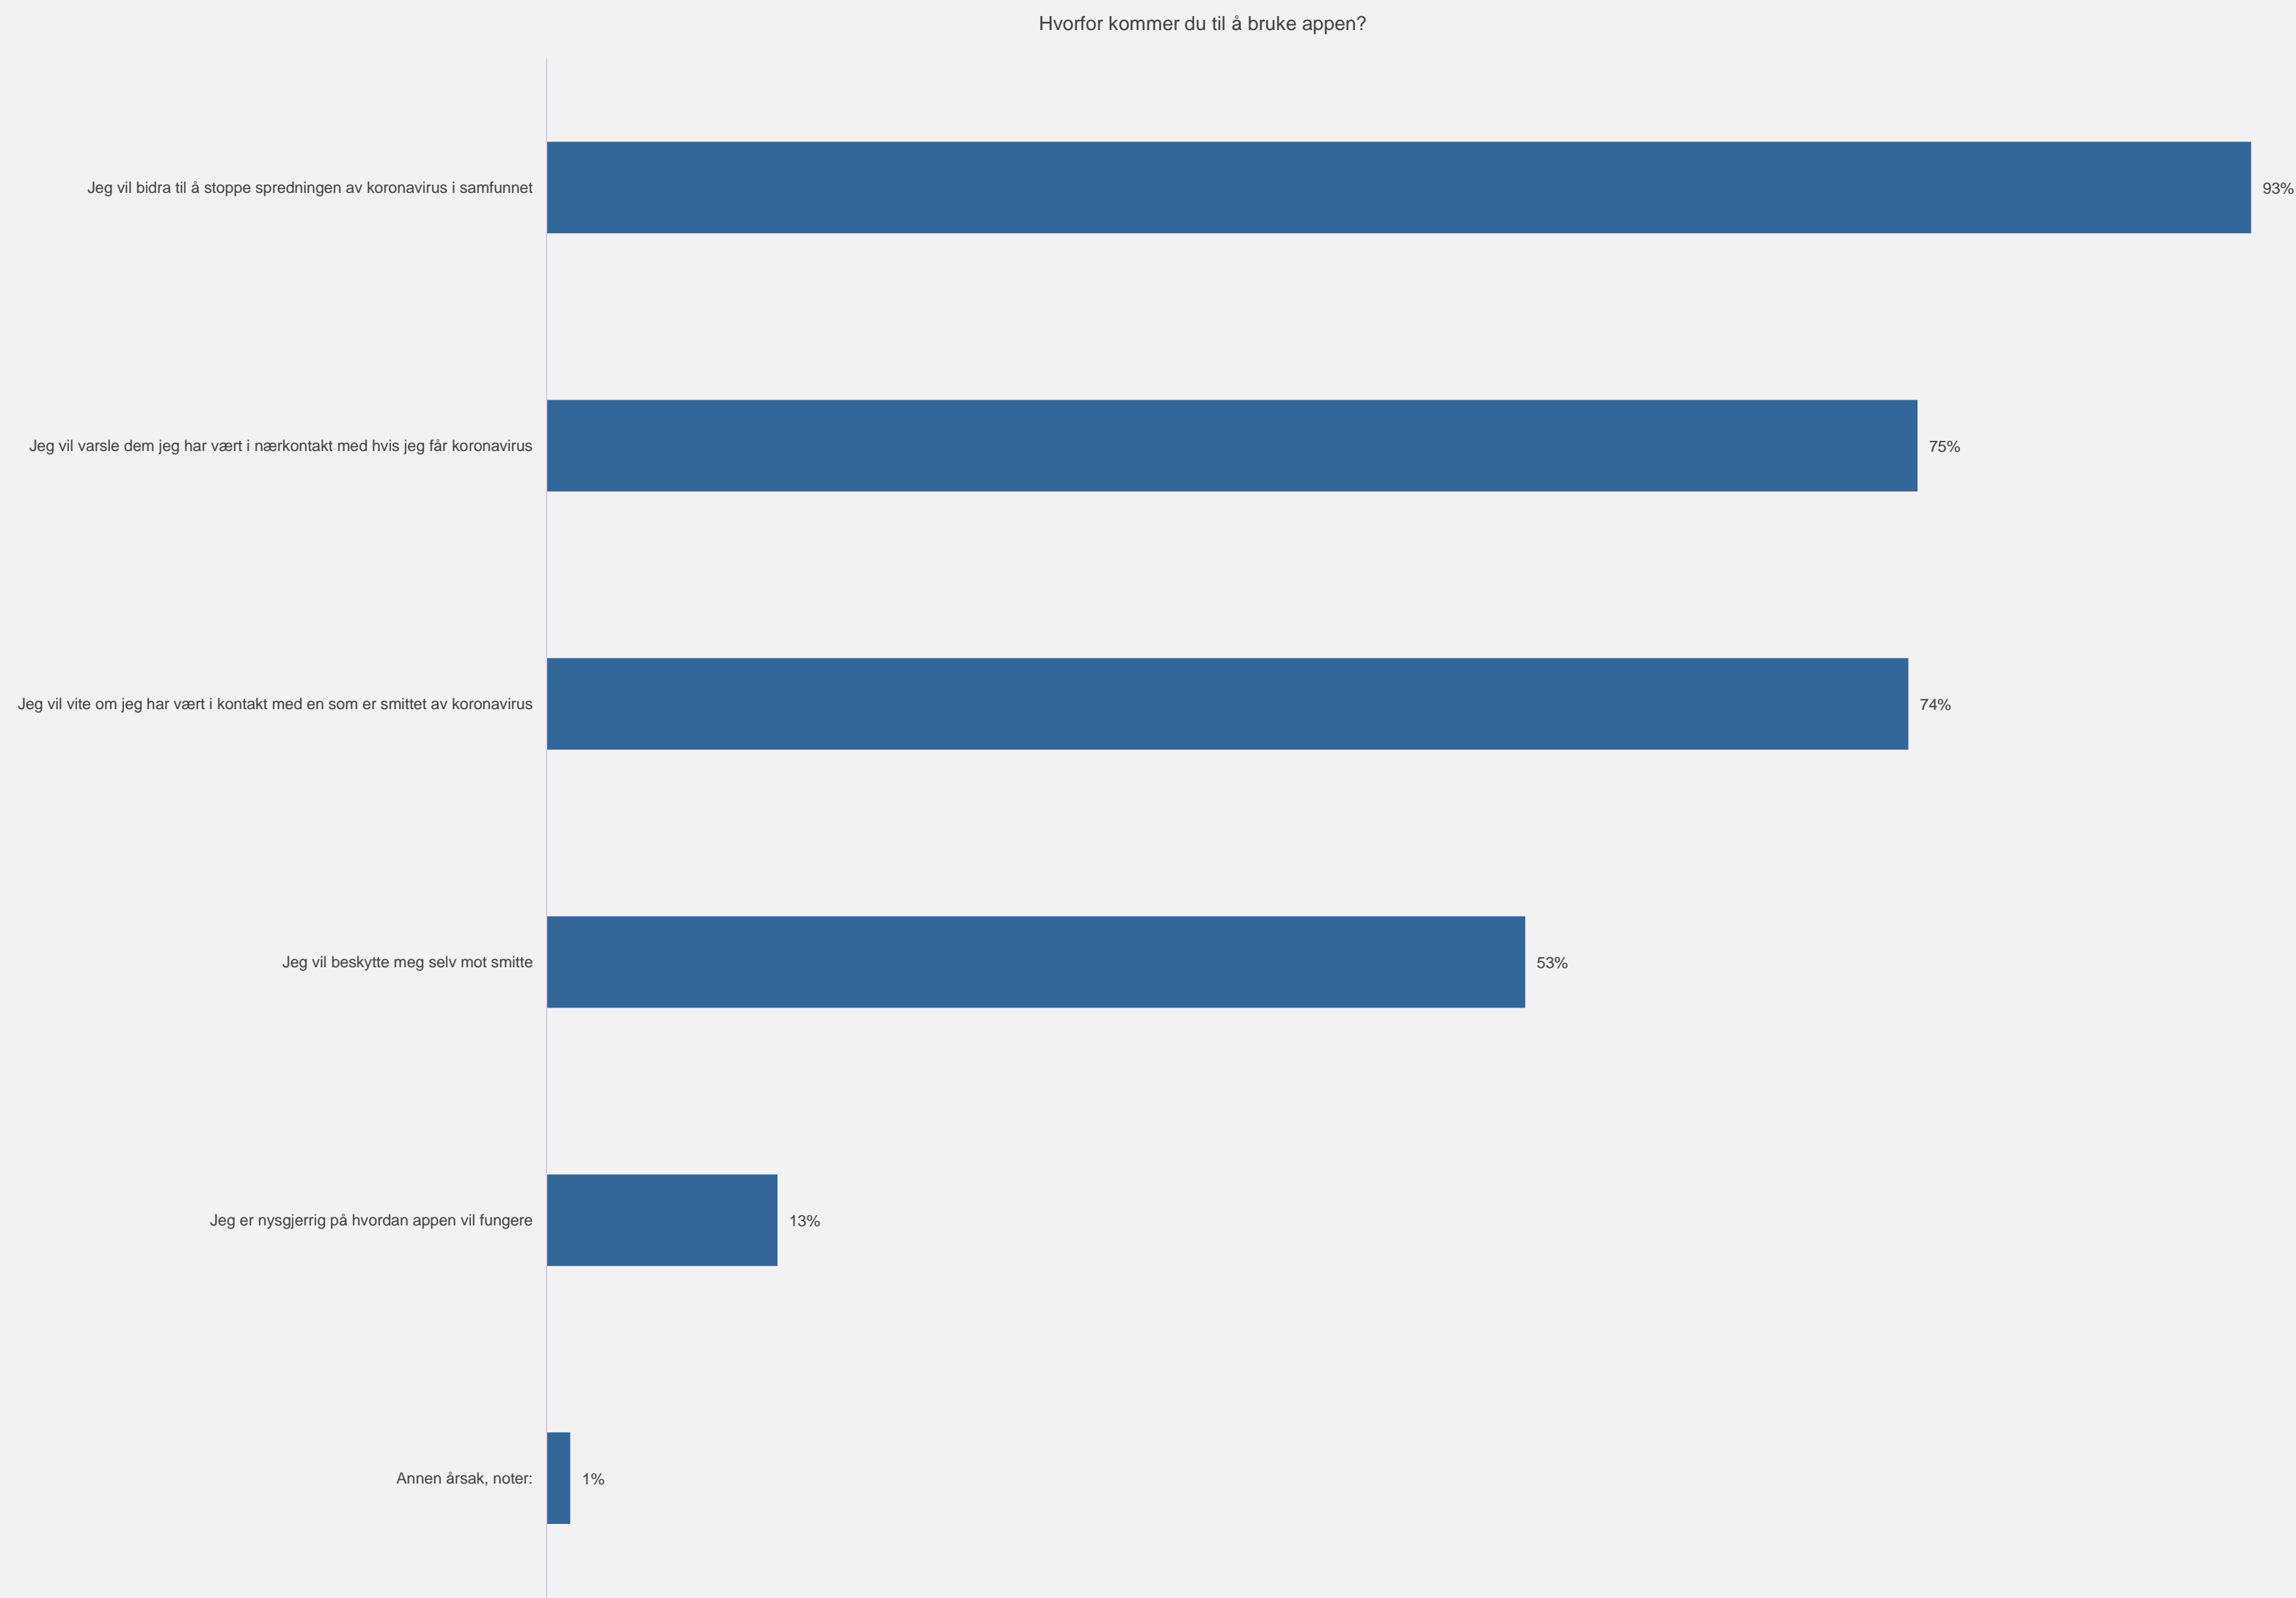

Personvern er den største barrieren.

Personer i alderen 30-39 år er signifikant mer bekymret for personvern, 74%, mens den yngste aldersgruppen svarer i signifikant større grad svarer at de tror appen kommer til å bruke for mye batteri, 40%.

Norstat: n= 358

