

Møte i prosjekstyremøte
Ny løsning for digital smittesporing
25.11.2020

Agenda

Prosjektstyremøte

- Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste, saker til evt.
- Sak 2: Status og risikoområder
 - Overordnet / tidsplan
 - App og backend-utvikling
 - Verifiseringsløsning / oppslag mot MSIS / infrastruktur (inkl. oppdatert status)
 - Personvern / DPIA
 - Informasjonssikkerhet / ROS
 - Test / kvalitet
 - Kommunikasjon (inkl. mediabudsjett)
 - Eksternt fagråd
 - Økonomi
- Sak 3: Konsekvenser av Schrems II
- Sak 4: Eventuelt
- Sak 5: Neste prosjektstyremøte

Status

Smittestopp
Status for uke 47
25.11.2020


Status for uke 47 - Overordnet

Smittestopp

- Gjennomført statusmøte med HOD 21.11.
- 3. Sprintdemo gjennomført. 4. sprint pågår.
- Oppstart av integrasjonstest muligens 1 dag eller to forsinket, men dette vil ikke påvirke sluttdato for test
- Avventer tilbakemelding vedr. DPIA og ROS
- Kommunikasjon: Planer legges, kampanje lages
- Fortsatt positivitet rundt åpenhetsstrategi og fagråd
- Ny presentasjon for politisk nivå i HOD planlagt 30.11.
- Oppsummert, det går virkelig bra og vi ligger i forhold til planen for å nå lansering 21/12, MEN
- Schrems II gjør det veldig vanskelig (kanskje umulig) å bruke Azure som driftsplattform, som planlagt

Overordnet tidsplan

Smittestopp

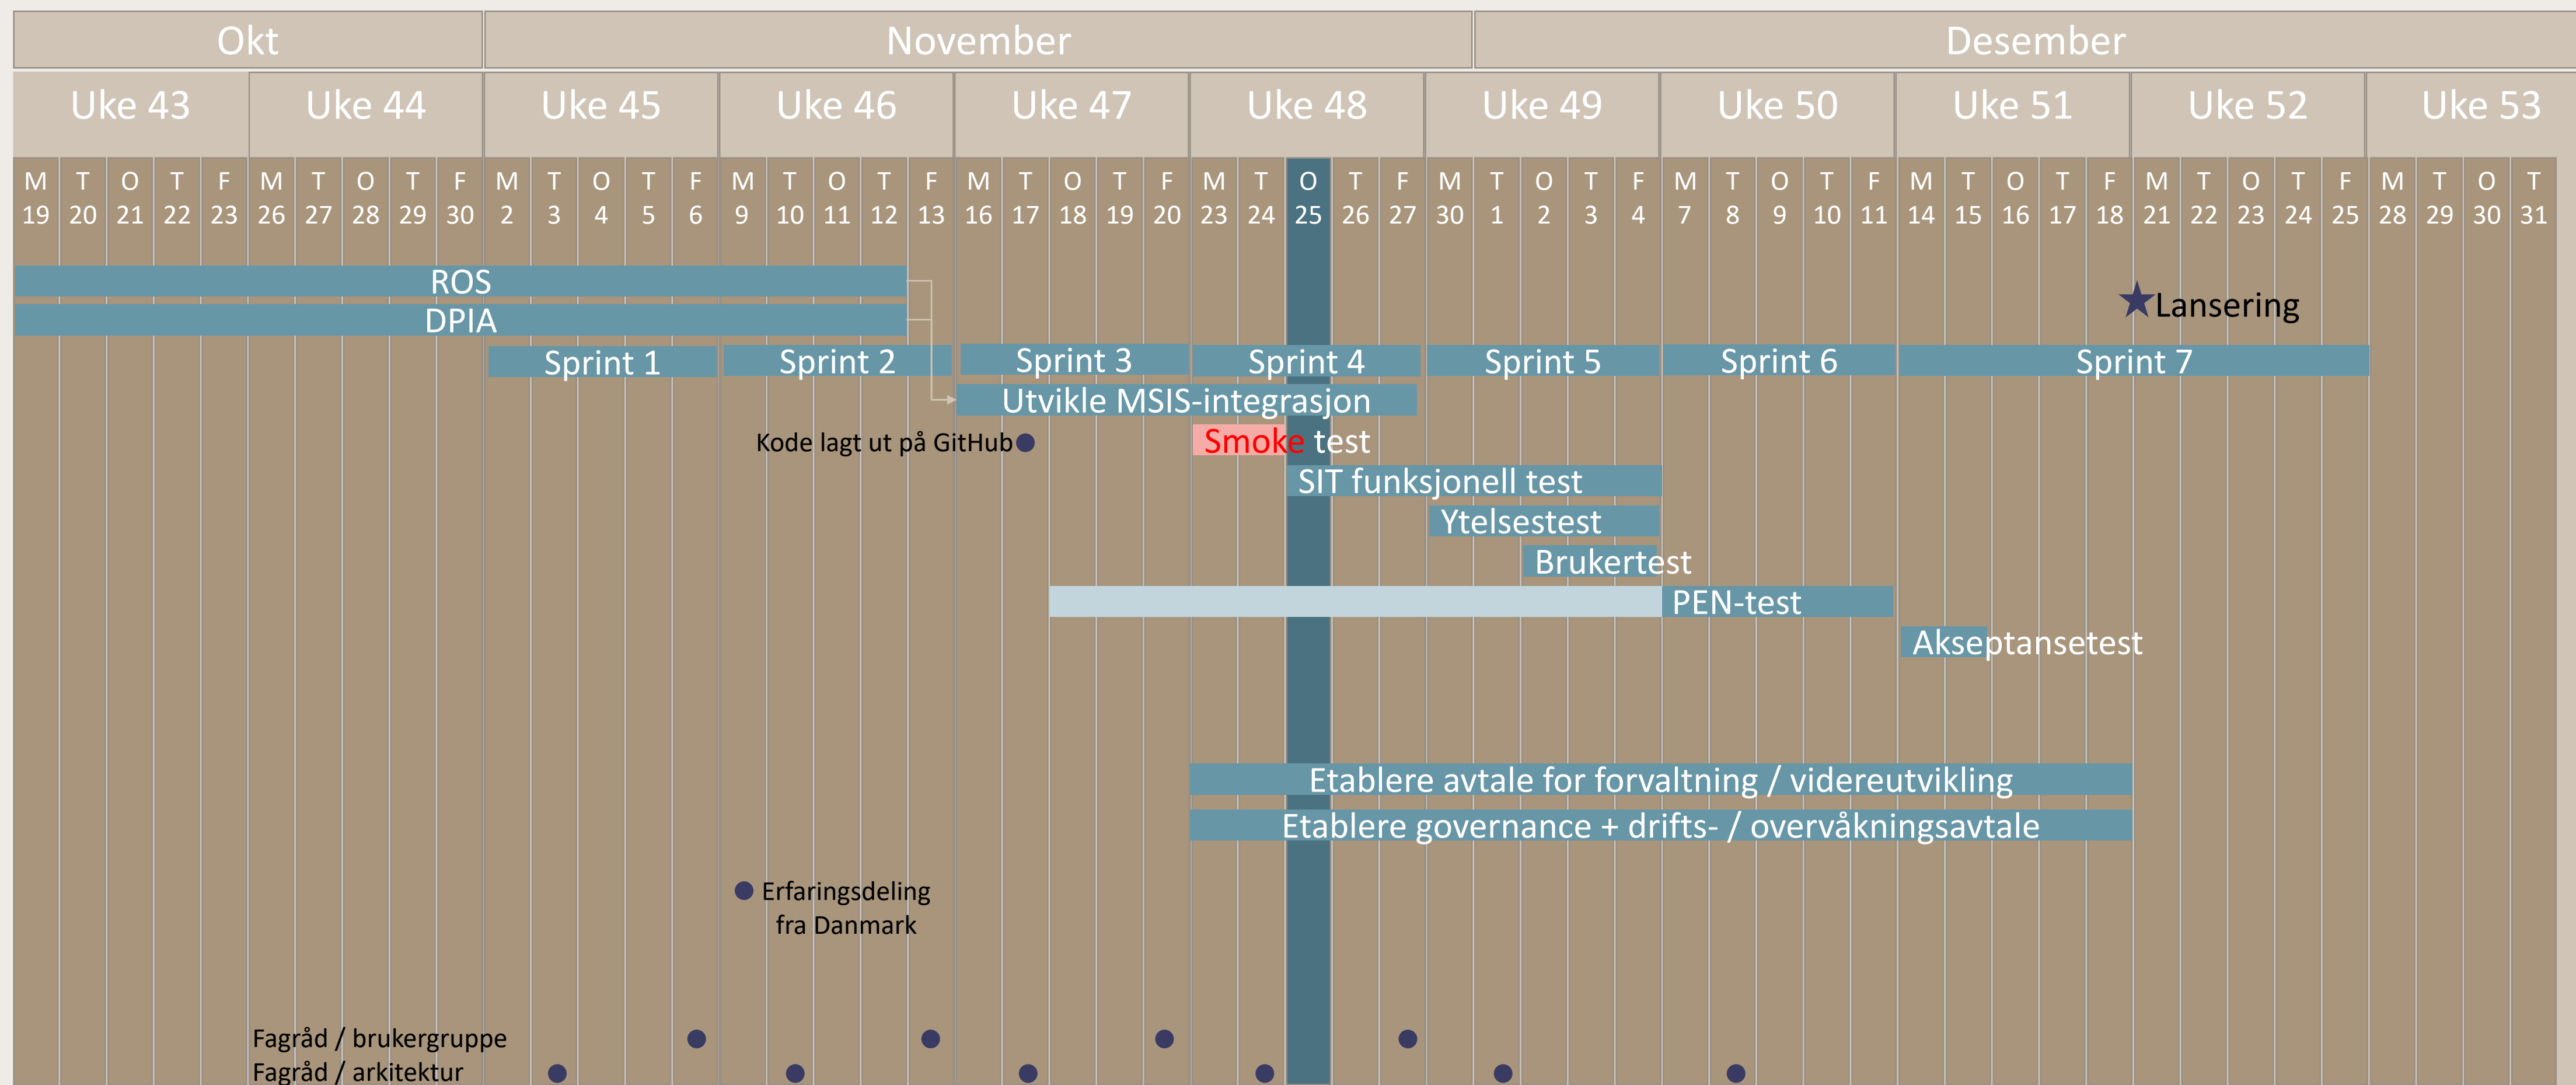

Status for uke 47: App og backend-utvikling

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Lagt koden ut på GitHub
 - Oppdatere brukergrensesnitt for å melde seg smittet, svarskjema ved å melde seg smittet, feilmeldinger, app-tilganger og notifikasjoner
 - Implementert flyt for å laste opp nøkler, venter på signering fra Google
 - Ferdigstilt logo og icon
 - Skrevet testcaser sprint 3 og eksekvert tester for sprint 1 og 2
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Etablere Smittestopp i resterende miljøer, samt sette opp logging og bygg pipelines
 - Oppdatere brukergrensesnitt for meldinger, samt legge inn logo og ny Font
 - Skrive test caser for sprint 4 og eksekvere tester for sprint 3
 - Feilretting
- Usikkerheter (Risiko)
 - Forsinkelse av etablering av infrastruktur kan påvirke prosjektplanen og oppstart av endte-til-ende testing, ytelsestesting og UAT

Status for uke 46 verifiseringsløsning/oppslag mot MSIS/infrastruktur

- Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)
 - Support og feilretting i integrasjon mellom verifiseringsløsning og app
 - Oppsett testmiljø
- Plan den neste uken (overordnet nivå)
 - Videre oppsett testmiljø, qa, prod
- Usikkerheter (Risiko)
 - Feil ved innlogging forskjellige brukere fra samme enhet via ID-porten (er i dialog med DigDir)

Status for uke 47: Informasjonssikkerhet/ROS

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Videre jobbing med risikoscenarier
 - Gjennomført ekstern workshop
 - Presentert Smittestopp på Normkonferansen
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Se på risikoreducerende tiltak
 - Gjennomføre ny ekstern workshop
 - Gjennomgå sikkerhetsmonitorering
- Usikkerheter (Risiko)
 - Schrems II

Status for uke 47: Personvern/DPIA

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Ferdigstilt samtykketekstene
 - Jobbet med personvernerklæring, oversendt WR for innspill
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Ferdigstille personvernerklæringen
- Usikkerheter (Risiko)
- Bruken av Microsoft som databehandler og mulig overføring av personopplysninger til USA.

Status for uke 47: Test og kvalitet

- **Hva er gjort den siste uken (overordnet nivå)**
 - Mye fokus på klargjøring for SIT og Konfigurasjonstest plan den 27 og 30.november
 - Fikk presentert analyser og resultater fra Danmark sin Konfigurasjonstest
 - Funka er bestilt til å gjennomføre test av Universell utforming. De kan starte senest neste uke.
 - Har hatt møte om ytelsestest, de kan starte mandag neste uke
 - Diverse møter rundt tekst, lenker og hvor informasjon for appen skal ligge
- **Plan den neste uken (overordnet nivå)**
 - Få godkjent en 0.9 versjon av teststrategi og overordnet testplan
 - Gjennomføre Konfig test og SIT test i tillegg til å få analysert testresultatene (Netcompany hjelper til med dette)
- **Usikkerheter (Risiko)**
 - Å teste krever en del manuell klargjøring, usikkert hvor lang tid dette tar i praksis
 - Testmiljø er ikke klart enda, kan eventuelt kjøre testene i et stabilt utviklingsmiljø
 - Feil ved pålogging mot ID porten, usikker pr nå hvordan dette påvirker testingen

Status for uke 47: Kommunikasjon

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Startet arbeidet med info og spørsmål og svar på Helsenorge inkl møter med Helsenorge-redaksjonen
 - Møte om brukerstøtte med Helfo og Helsedirektoratet
 - Kampanjearbeid
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Fokusgruppeundersøkelse i regi av Dinamo torsdag med unge med innvandrerbakgrunn samt eldre målgrupper for å undersøke ulike sider ved kampanjeplanene
 - Slutføre informasjon om appen til Helsenorge og andre plattformer samt gjøre klar til publisering
 - Forberede informasjon på andre språk
- Usikkerheter (Risiko)

Status for uke 47: Eksternt fagråd

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
 - Gjennomført møter i arkitekturråd og brukerforum
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
 - Møte i fagråd / arkitektgruppen (tirsdager)
 - Møte i fagråd / brukerforum = demomøte (fredager)
- Usikkerheter (Risiko)

Status: Økonomi

- Hva er gjort de to siste ukene (overordnet nivå)
- Plan de neste to ukene (overordnet nivå)
- Usikkerheter (Risiko)

Ingen endringer siden sist

Konsekvenser pga Schrems II

Konsekvenser pga Schrems II

Schrems II



The screenshot shows the website of Datatilsynet (Data Protection Authority of Norway). The header includes the logo and name 'Datatilsynet' on the left, a search bar with the text 'Hva leter du etter?' and a magnifying glass icon in the center, and a 'MENY' button with a hamburger menu icon on the right. The main content area features a sub-header 'Aktuelle nyheter 2020' followed by the article title 'Spørsmål og svar om nye regler for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS'. The article text discusses the implications of the Schrems II ruling, stating that the EU Court of Justice has ruled that it is no longer sufficient to rely on standard contractual clauses or Binding Corporate Rules (BCR) for data transfers to non-EU countries. It also includes the date 'Sist oppdatert: 22.10.2020' and 'Publisert: 27.07.2020'. A sub-section titled 'Hva er en overføring av personopplysninger?' explains that data transfer occurs when information is sent to or accessed from another country, such as logging into a service with a server in Norway.

Datatilsynet

Hva leter du etter? Q | MENY ☰

Aktuelle nyheter 2020

Spørsmål og svar om nye regler for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

I Schrems II-dommen kommer EU-domstolen med tilleggskrav for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS (tredjeland). Det vil si at det ikke lenger er tilstrekkelig å bruke et gyldig overføringsgrunnlag slik som EU-kommisjonens standardbestemmelser eller bindende konsernregler (BCR).

Sist oppdatert: 22.10.2020

Publisert: 27.07.2020

Hva er en overføring av personopplysninger?

Med overføring av personopplysninger mener vi at personopplysningene sendes eller overføres til et annet land, eller at noen i et annet land får fjerntilgang til opplysningene. For eksempel, dersom du gir en russisk underleverandør tilgang til å logge seg inn og se dataene dine, selv om dataene kun er lagret på en server i Norge, regnes dette som en overføring.

Konsekvenser pga Schrems II

Hvordan påvirker dette oss?

- Schrems II gjelder også skytjenester som Azure, som vi ønsker å bruke
- USA er ikke godkjent tredjeparts land for håndtering av personopplysninger
- NHN (vår avtalepart) har ikke avtale med Microsoft som garanterer at data ikke overføres til USA
- FHI / Smittestopp har ikke behandlingsgrunnlag som tillater overføring av data til USA
- Det kan være en mulighet å endre Samtykke (gjøre oppmerksom på at data KAN bli overført til USA)
- EU tillater ikke tilknytning til EUs knutepunkt hvis det ikke finnes avtale med Microsoft som garanterer at data ikke overføres til USA (EU vil ikke akseptere løsninger som krever samtykke av enhver EU-borger som bruker en Covid-app)
 - Østerrike har i dag belyst saken og fått konkretisert denne problemstillingen. Samtidig, hvis Østerrike får på plass en avtale vil resten kunne løses (vha risikoreduserende tiltak)
 - Nederland fikk ikke løst dette iht deres framdriftsplan og valgte annen, nederlandsk tilbyder med database i Nederland

Konsekvenser pga Schrems II

Hvilke alternativer har vi?

1. Lage en norsk løsning basert på norsk samtykke som ikke lar seg koble til EUs knutepunkt (ikke reelt alternativ)
2. Endre Microsoft sin avtalepolicy (Hvis Østerrike kan, så kan vi også...)
3. Vente og se om EU endrer sitt standpunkt (hvis ikke Østerrike kan endre Microsoft, så kanskje EU endrer seg)
4. Etablere «On-premise» løsning

Hva gjør vi?

- Møte med Microsoft 26.11.2020
- Be noen om råd??? (NHN???)
- ???
